
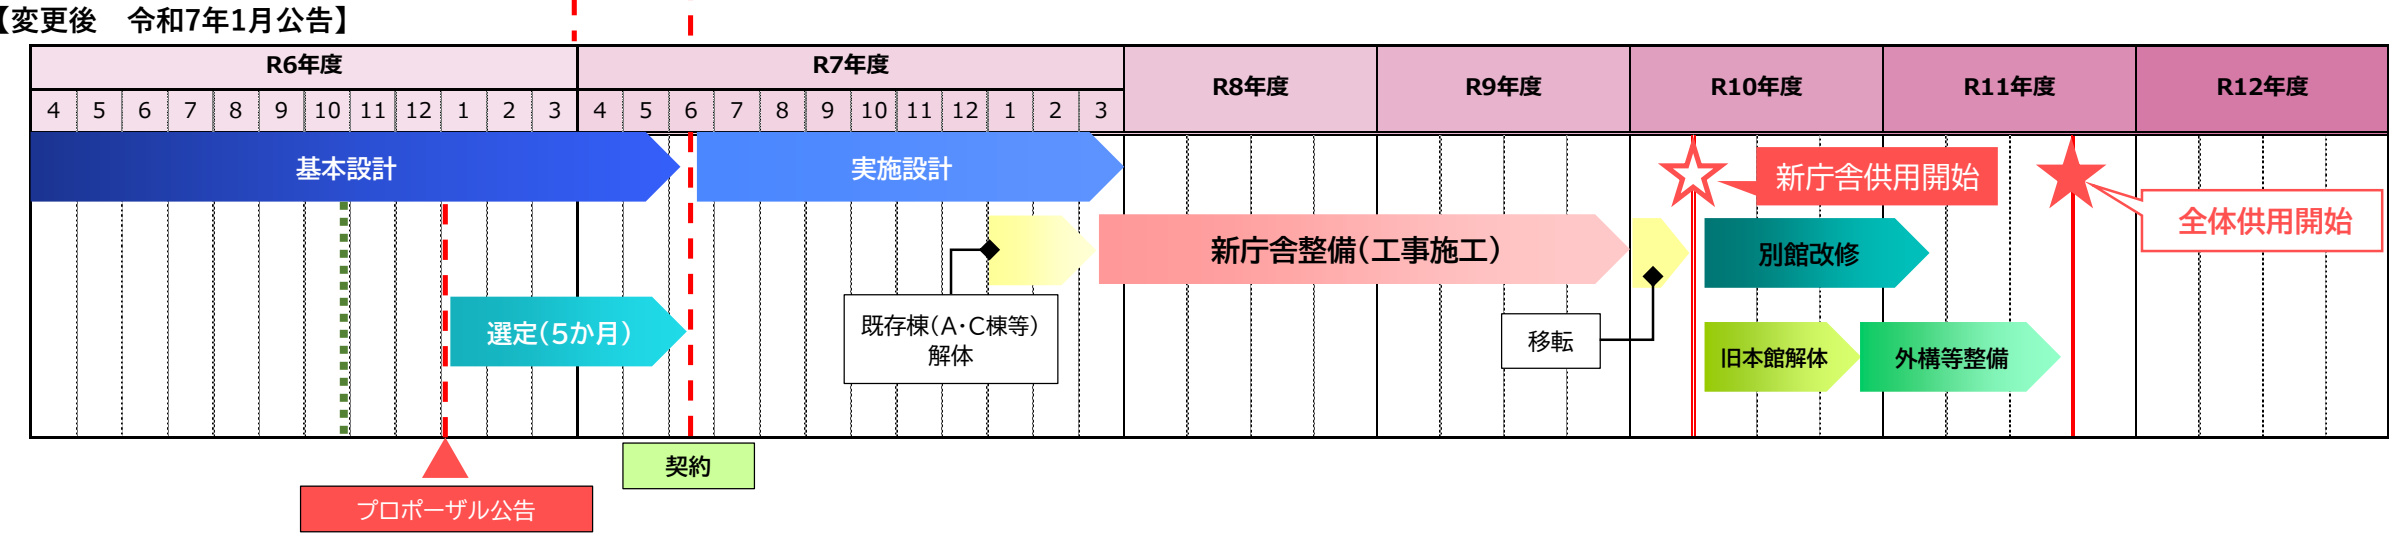


羽曳野市本庁舎建替整備事業 スケジュールについて

設計プラン・面積・コスト面での精査のため、当初の予定より2か月遅らせる形でスケジュールをずらすこととなりました。

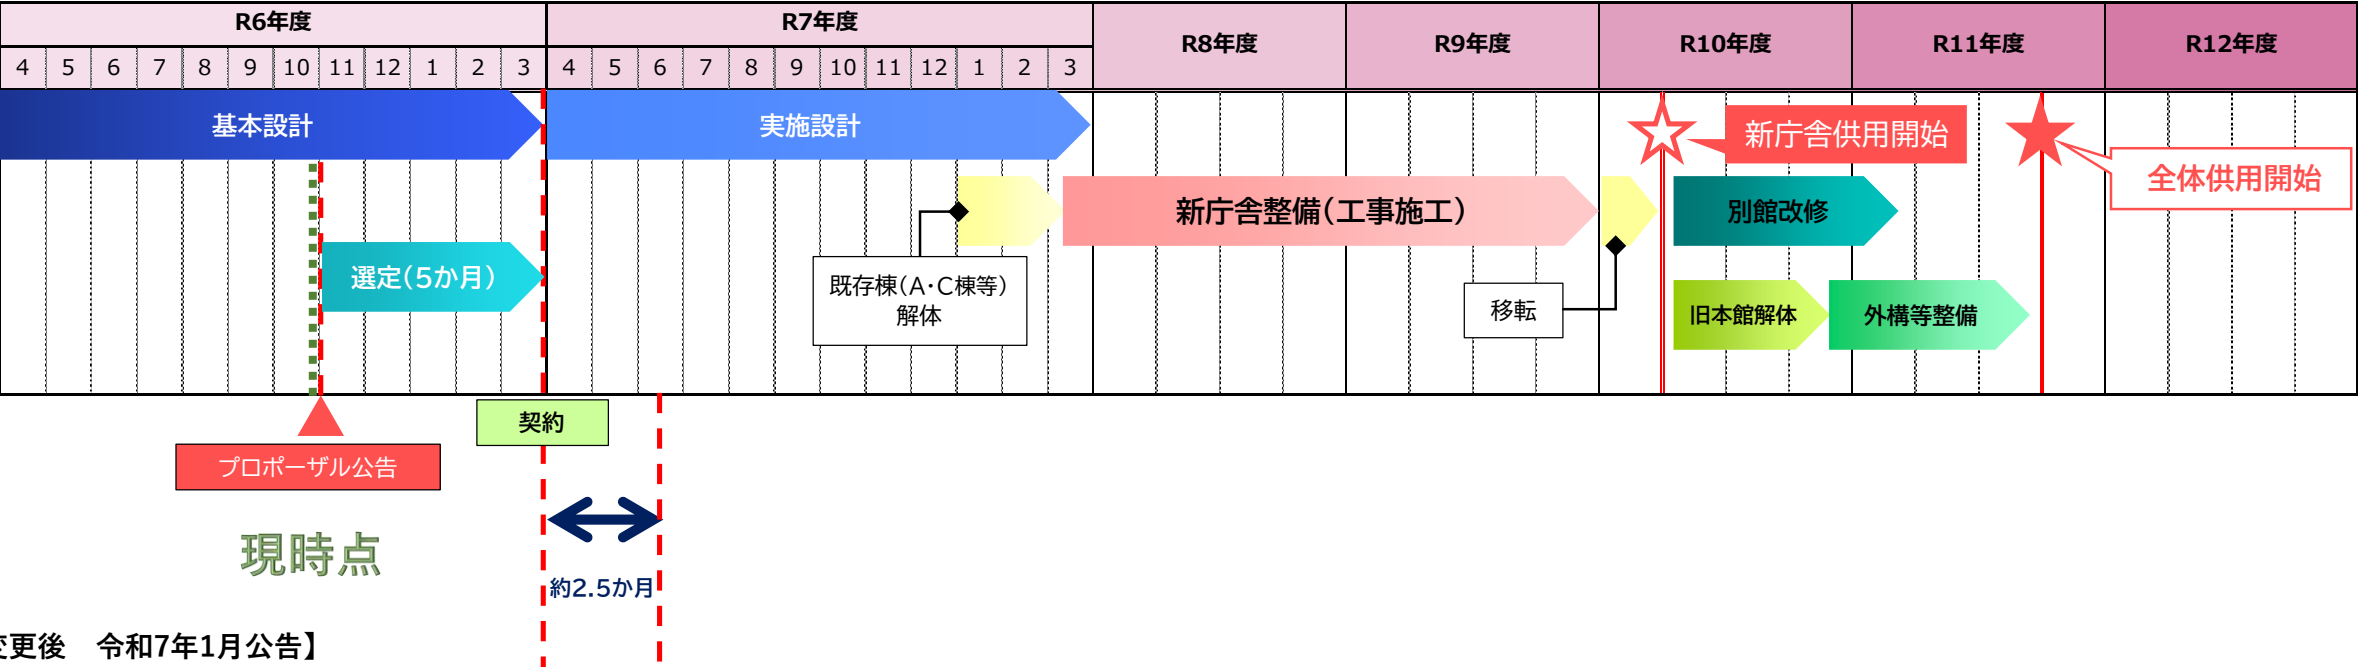

実施設計・施工(デザインビルド)事業者選定のためのプロポーザル 公告 令和6年11月 → 令和7年1月

実施設計 業務開始 令和7年4月 → 令和7年6月予定
