
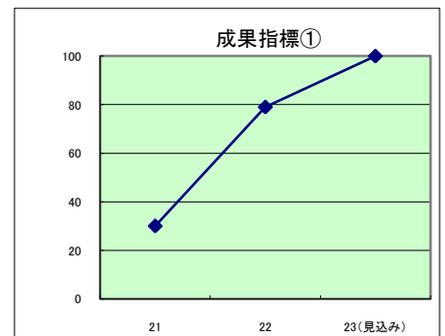


平成 23 年度 事務事業評価シート(平成 22 年度実施事業)

整理番号 教学教04

事務事業名		古市小学校屋内運動場・校舎改築事業		予算科目	会計	1	一般会計	
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	3	次代を担う子どもを育むまち		款	10	教育費	
	施策(節)	2	学校教育		項	2	小学校費	
	施策の方向	(2)	教育環境の整備・充実		目	1	学校管理費	
関連する計画等					事業	79	古市小学校屋内運動場改築事業	
事業の目的	対象(誰を・何を) 児童・生徒・教職員・地域住民 意図(どういう状態にしたいのか) 老朽化の講堂に代わって、新たに屋内運動場と校舎の改築を行い、教育環境の充実と災害時の避難場所としての安全確保を図る。			作成部署	教育委員会事務局学校教育室教育総務課			
事業の内容	講堂上部の教室部分に代わる、校舎改築工事を実施した。また、翌23年度予定の講堂・渡り廊下解体、渡り廊下新設工事の実施設計を行った。さらに、屋内運動場敷地について借地部分の整理を行うために土地調査を行った。 概要：平成20～21年度 屋内運動場 鉄筋コンクリート造 930㎡ 平成22年度 改築校舎棟 鉄筋コンクリート造 675㎡ 平成23年度 講堂・渡り廊下解体、渡り廊下新設 平成24年度(予定) 屋内運動場敷地土地整理			連絡先	072-958-1111 内線 4131			
根拠法令等	学校教育法、小学校設置基準、地震防災対策特別措置法他							
事業開始時期	<input type="checkbox"/> 昭和 18年開始 <input type="checkbox"/> 明確にはわからない <input checked="" type="checkbox"/> 平成		<input type="checkbox"/> 市制施行(昭和34年)以前より行っている		終了年度	平成 24 年度		
事業開始時からの状況変化	建物自体の経年劣化による老朽化に加え、昨今の学習形態の多様化に伴って、それに相応しい改修修繕を行ってきた。							
市民や議会の要望	安全で快適な教育環境の整備							
実施手法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他( )							
委託先	<input type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称( )			委託内容				
	<input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他			実施設計、工事監理、土地交換調査				

区分		21年度(実績)	22年度(実績)	23年度(見込み)	
事業費【1】	(千円)	95,208	183,062	71,961	
人件費【2】	(千円)	6,000	2,880	3,600	
職員数	正規職員	0.80 人	0.40 人	0.50 人	
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	臨時職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
超過勤務(参考)	(時間)	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間	
総事業費(【1】+【2】)【A】	(千円)	101,208	185,942	75,561	
財源内訳	国費	(千円)	42,960	171,276	11,984
	府費	(千円)			
	市債	(千円)	23,000	8,400	30,400
	その他(手数料・使用料等)	(千円)			
	一般財源	(千円)	35,248	6,266	33,177
活動指標(事業の活動実績)【B】	単位	21年度	22年度	23年度(見込み)	
① 調査、設計、工事、監理等件数	件	2	5	4	
②					
③					
活動単位当たりコスト(【A】/【B】①)		50,604,000 円	37,188,400 円	18,890,250 円	
市民1人当たりコスト(【A】/人口)		851 円	1,575 円	640 円	

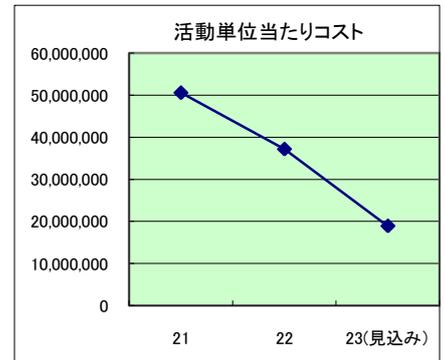

成果指標	指標名	単位	指標設定の考え方	平成21年度		平成22年度		平成23年度	
				目標	実績	目標	実績	目標	実績
①	事業進捗率 (式) 各年度毎終了事業経費÷事業全体経費×100	%	改築事業全体を100とした場合の工程の進捗割合	30	30	79	79	100	100
						達成率(%)	100.0%		
②	(式)			目標		目標		達成率(%)	
				実績		実績			

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性	分析・評価の説明
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある		
○	○		○		○	○				有	屋内運動場を新築し、避難場所の機能を整備する。また、校舎を改築して、講堂や渡り廊下の解体を行い、古市小学校全体の環境整備を図る。

視点	分析のためのチェック点	はい	いいえ	該当なし	分析・評価の説明
妥当性	市民ニーズが高い	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	従来講堂を利用しての体育実技について十分な教育活動ができず、さらに避難場所としての機能を充実させるために、新たな屋内運動場の整備が渴望されていたところである。また、講堂上部の教室部分に相当する校舎棟を改築して、良好な教育環境の改善を図るものである。
	市民ニーズと比較してサービスの供給過剰となっていない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	社会情勢の変化に対応している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	国・府の事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業を休止、廃止した場合の影響度が大きい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	緊急性が認められる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
効率性	単位コストが適切である(経年、他市比較など)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	講堂上部の教室に対応する校舎棟を改築したが、電子入札を行うことで透明性が高く、効率的な予算執行ができた。また、国からの補助を得ながら経年劣化で老朽化した講堂機能を改築することで、建物管理におけるランニングコストが軽減される。
	受益者負担の割合は適当である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	簡略化できる方法や手段がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市の他事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	民間活力(民間委託、NPO、ボランティア、PFIなど)の活用について検討の余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
有効性	上位の施策(目的)が明確である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	教育環境の充実や、児童、地域住民の安全確保を図る上で有効な事業である。
	上位の施策(目的)への貢献度が高い事業である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	成果を向上させる余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市民の視点にたってサービスが提供されている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協働性	事業の企画、立案に市民が参加している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	事業実施に際しては、学校側の基本的な意見を取りまとめ、また工事等については、近隣住民への説明や内容周知に努めている。
	事業の実施に向けて、市民と情報の共有が図られている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業の実施について積極的に市民の意見を反映している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業の実施に市民の参加、協力が得られている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
達成度	成果指標の目標値は適正である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	当該年度に計画していた校舎改築工事については、年度内に終了した。
	成果指標の実績値は目標値以上である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	成果指標は前年度より向上している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

担当部局評価	総合評価							
	<input type="checkbox"/> 拡大・充実 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 方法改善 <input type="checkbox"/> 民営化・民間委託 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了							
	評価の理由							
	<p>平成18年度開始の屋内運動場改築事業については、平成22年度に至っては講堂上部教室の校舎改築工事を実施し、年度ごとの計画に沿って、順調に進捗している状況である。</p> <p>今後に向けて(取組方針、具体的な改善改革案など)</p> <p>平成23年度には、講堂の解体、またこれに接続している渡り廊下の解体・新設の工事が予定されている。屋内運動場敷地内の借地については、一定の整理を行い、平成24年度を目途に土地交換等を行う予定である。</p>							

行革本部評価	総合評価				評価理由・意見			
	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大・充実	<input type="checkbox"/> 現状維持	<input type="checkbox"/> 方法改善	<input type="checkbox"/> 民営化・民間委託	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 廃止・休止	<input type="checkbox"/> 完了	
