



平成 24 年度 事務事業評価シート(平成 23 年度実施事業)

整理番号

教学教02

事務事業名		誉田中学校新築建替え事業		予算科目	会計	1	一般会計
					款	10	教育費
					項	3	中学校費
					目	1	学校管理費
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	3	次代を担う子どもを育むまち	事業	68	誉田中学校新築建替えに向けた基本設計	
	施策(節)	2	学校教育				
	施策の方向	(1)	義務教育の充実	作成部署	学校教育室 教育総務課		
関連する計画等				連絡先	072 - 958 - 1111 内線 4131		
事業の目的	対象(誰を・何を)						
	誉田中学校						
	意図(どういう状態にしたいのか)						
事業の内容	耐震性能が劣る経年老朽化した校舎改築、補強や改修を図る。また、運動場等の整備を併せて教育環境の整備を行う。						
	誉田中学校校舎や体育館の改築や耐震補強・老朽改修整備工事を行う。						
	平成23年度 基本設計						
	平成24年度 実施設計、改築工事に伴う埋蔵文化財調査						
	平成25年度 体育館の耐震補強・老朽改修工事、校舎改築工事						
平成26年度 校舎改築工事、平成27年度には既存校舎の耐震補強や改修、そして校舎解体工事を予定。							
平成27年度 既存校舎の耐震補強・老朽改修工事、改築に伴う解体工事、運動場整備等							
根拠法令等		学校教育法、中学校設置基準、地震防災対策特別措置法他					
事業開始時期		平成 23 年度開始				終了年度	平成 27 年度
事業開始時からの状況変化		耐震性能を確保した学校施設整備のニーズが高まっている。					
市民や議会の要望		児童等が1日の大半を過ごす施設なので、耐震性能を備えた建物整備の要望等					
実施手法		☐ 直営 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助金・助成金 ☐ その他()					
委託先		☐ 外郭団体委託	名称	委託内容 基本設計業務			
		☒ 民間委託					

区 分		22年度	23年度	24年度
		(実績)	(実績)	(見込み)
事業費【1】 (千円)		0	11,624	56,753
人件費【2】 (千円)		0	3,295	3,124
職員数	正規職員	0.00 人	0.45 人	0.45 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.10 人	0.01 人
	超過勤務(参考) (時間)	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		0	14,919	59,877
財源内訳	国費 (千円)		0	0
	府費 (千円)		0	0
	市債 (千円)		0	0
	その他 (手数料・使用料等) (千円)		0	0
	一般財源 (千円)	0	14,919	59,877
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		22年度	23年度	24年度(目標)
① 基本設計件数 件		0	1	1
② 実施設計件数 件		0	0	1
③ 埋蔵文化財調査件数 件		0	0	1
活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】 ①)		円	14,919,000 円	59,877,000 円
市民1人当たりコスト (【A】 / 人口)		0 円	127 円	513 円

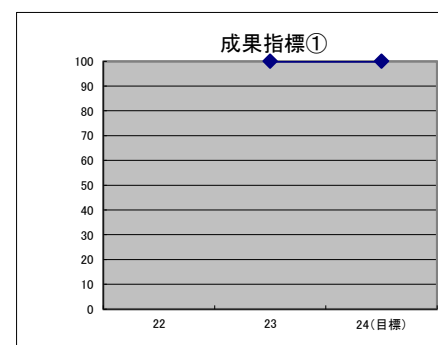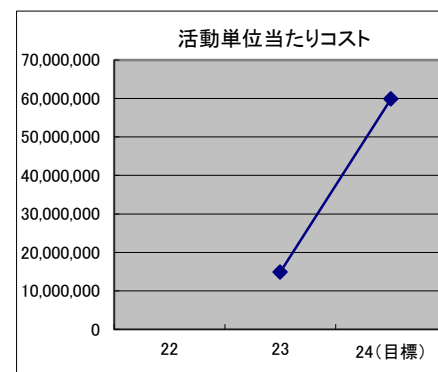

成果指標 (事業目的の達成度を測る指標)	指標名		単位	指標設定の考え方	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	①	基本・実施設計進捗率 (式)	%	設計事務全体を100とした場合の工程の進捗割合 (各年度毎終了事業経費÷全体事業経費)×100	目標	100	達成率(%)
					実績	100	100.0%
	②	(式)			目標		達成率(%)

