



事務事業名	埴生小学校移転整備事業		会計	1	一般会計	
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	3	次代を担う子どもを育むまち	款	10	教育費
	施策(節)	2	学校教育	項	2	小学校費
	施策の方向	(1)	義務教育の充実	目	1	学校管理費
				事業	88	埴生小学校整備事業
関連する計画等			作成部署	学校教育室 教育総務課		
			連絡先	072 - 958 - 1111 内線 4131		
事業の目的	対象(誰を・何を) 埴生小学校 意図(どういう状態にしたいのか) 耐震性能を備えた学校施設に移転し、併せて教育的環境の整備を行い、学校施設の有効活用を図る。					
事業の内容	埴生小学校は、耐震診断の結果、公共施設として要求される耐震性能が劣ることが判明した。よって、耐震性能を確保した学校施設を整備するため、隣接する羽曳野中学校の建物を一部改修等を行い、併せて学校施設の有効活用を図るものである。 平成23年度 基本設計 平成24年度 実施設計・移転整備工事 平成25年度 移転整備工事					
根拠法令等	学校教育法、小学校設置基準、地震防災対策特別措置法他					
事業開始時期	平成 23 年度開始			終了年度	平成 25 年度	
事業開始時からの状況変化	耐震性能を確保した学校施設の整備のニーズが高まっている。					
市民や議会の要望	児童等が1日の大半を過ごす施設なので、耐震性能を備えた建物整備の要望等					
実施手法	☐ 直営 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助金・助成金 ☐ その他()					
委託先	☐ 外郭団体委託 ☒ 民間委託	名称	委託内容 基本設計業務			

区 分		22年度 (実績)	23年度 (実績)	24年度 (見込み)
事業費【1】 (千円)		0	2,762	6,248
人件費【2】 (千円)		0	1,399	1,570
職員数	正規職員	0.00 人	0.20 人	0.20 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.01 人	0.10 人
	超過勤務(参考) (時間)	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		0	4,161	7,818
財源内訳	国費 (千円)			
	府費 (千円)			
	市債 (千円)			
	その他 (手数料・使用料等) (千円)			
	一般財源 (千円)	0	4,161	7,818
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		22年度	23年度	24年度(目標)
① 基本設計進捗状況	件	0	1	1
② 実施設計進捗状況	件	0	0	1
③		0	0	0
活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】 ①)		円	4,161,000 円	7,818,000 円
市民1人当たりコスト (【A】 / 人口)		0 円	36 円	67 円

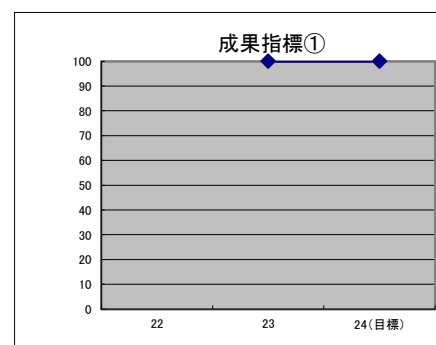

成果指標 (事業目的の達成度を測る指標)	指標名	単位	指標設定の考え方	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	① 基本・実施設計進捗率	%	設計事務全体を100とした場合の工程の進捗割合	目標	100	100
	(式)		(各年度毎終了事業経費÷全体事業経費)×100	実績	100	100.0%
	② (式)			目標		達成率(%)

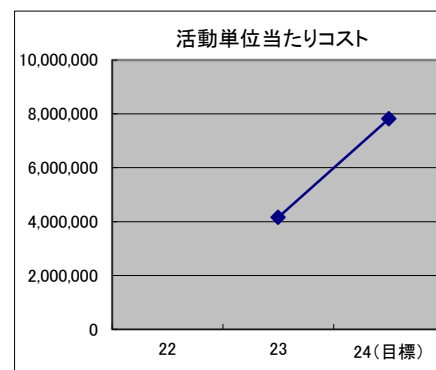
