



平成 23 年度 事務事業評価シート(平成 22 年度実施事業)

整理番号

生衛18

事務事業名		(仮称) リサイクルプラザ整備事業		予 算 科 目	会計	1	一般会計	
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	1	安全・安心、快適で住みやすいまち		款	4	衛生費	
	施策(節)	6	リサイクル		項	2	清掃費	
	施策の方向	(1)	ごみの減量化、再資源化の推進		目	3	ごみ減量・リサイクル事業費	
関連する計画等	一般廃棄物処理基本計画				事業	91	#N/A	
事業の目的	対象(誰を・何を) 市民・事業者・行政			作成部署	生活環境部環境衛生課			
事業の内容	意図(どういう状態にしたいのか) 協働体制のもとで、ごみ減量・リサイクルの促進に向けて、地域への普及・啓発を進める。			連絡先	072-958-1111	内線 2820		
事業の内容	平成21年度：基本プラン調査業務 平成22年度：新築工事实施設計業務 平成23年度：新築工事							
根拠法令等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律							
事業開始時期	<input type="checkbox"/> 昭和 21 年開始 <input type="checkbox"/> 明確にはわからない <input checked="" type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 市制施行(昭和34年)以前より行っている		終了年度		平成 年度			
事業開始時からの状況変化								
市民や議会の要望								
実施手法	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他( )							
委託先	<input type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称( ) <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他			委託内容	リサイクルプラザ新築工事实施設計業務			

区 分		21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (見込み)
事業費【1】	(千円)	2,650	8,400	140,000
人件費【2】	(千円)	2,175	2,520	2,520
職員数	正規職員	0.29 人	0.35 人	0.35 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	超過勤務(参考)	(時間) 0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費(【1】+【2】)【A】	(千円)	4,825	10,920	142,520
財源内訳	国費	(千円)		
	府費	(千円)		
	市債	(千円)		94,500
	その他(手数料・使用料等)	(千円)		
	一般財源	(千円)	4,825	10,920
活動指標(事業の活動実績)【B】	単位	21年度	22年度	23年度(見込み)
① 設計等委託・工事件数	回	1	1	1
②				
③				
活動単位当たりコスト(【A】/【B】①)		4,825,000 円	10,920,000 円	142,520,000 円
市民1人当たりコスト(【A】/人口)		41 円	92 円	1,208 円

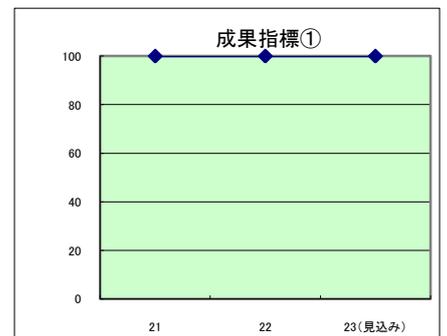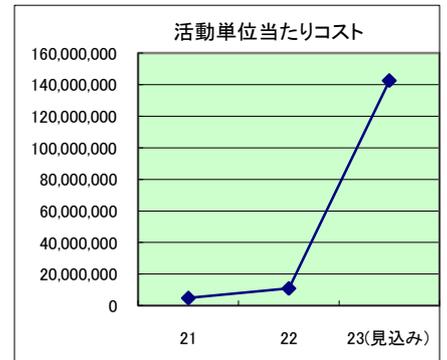

成果指標 (事業目的の達成度を測る指標)	指標名	単位	指標設定の考え方	平成21年度	平成22年度	平成23年度
	①	新築工事实施設計業務実施率(式)	%	リサイクルプラザ新築工事を施行するための、実設計業務の完了。	100	100
				目標実績	100	100
					達成率(%)	100.0%
②	(式)			目標実績		
					達成率(%)	

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性	分析・評価の説明
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある		有

視点	分析のためのチェック点	はい	いいえ	該当なし	分析・評価の説明
		妥当性	市民ニーズが高い	<input checked="" type="checkbox"/>	
妥当性	市民ニーズに比較してサービスの供給過剰となっていない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
妥当性	社会情勢の変化に対応している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
妥当性	他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
妥当性	国・府の事業と重複していない	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
妥当性	事業を休止、廃止した場合の影響度が大きい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
妥当性	緊急性が認められる	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
効率性	単位コストが適切である(経年、他市比較など)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	管理運営体制について、民間活力の活用について検討の余地がある。
	受益者負担の割合は適当である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	簡略化できる方法や手段がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市の他事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	民間活力(民間委託、NPO、ボランティア、PFIなど)の活用について検討の余地がない	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
有効性	上位の施策(目的)が明確である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	市民・事業者・行政が協働して、地域におけるごみ減量・リサイクルの取り組みを率先していく上で、拠点施設を整備することは有効である。
	上位の施策(目的)への貢献度が高い事業である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	成果を向上させる余地がない	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市民の視点にたつてサービスが提供されている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協働性	事業の企画、立案に市民が参加している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	市民、事業者、行政が協働して、ごみの減量化・再資源化の促進に取り組んでいる。
	事業の実施に向けて、市民と情報の共有が図られている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業の実施について積極的に市民の意見を反映している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業の実施に市民の参加、協力が得られている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
達成度	成果指標の目標値は適正である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	目標達成のために取り組んでいる。
	成果指標の実績値は目標値以上である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	成果指標は前年度より向上している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

担当部局評価	総合評価							
	<input type="checkbox"/> 拡大・充実 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 方法改善 <input type="checkbox"/> 民営化・民間委託 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了							
	評価の理由							
	<p>新築工事の施行に伴う実施設計を完了した。</p> <p>今後に向けて(取組方針、具体的な改善改革案など)</p> <p>平成23年度に建設工事を施工し、年度末の竣工を目指す。並行して管理運営体制の確立にも取り組む。</p>							

行革本部評価	総合評価				評価理由・意見			
	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大・充実	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持	<input type="checkbox"/> 方法改善	<input type="checkbox"/> 民営化・民間委託	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 廃止・休止	<input type="checkbox"/> 完了	
