
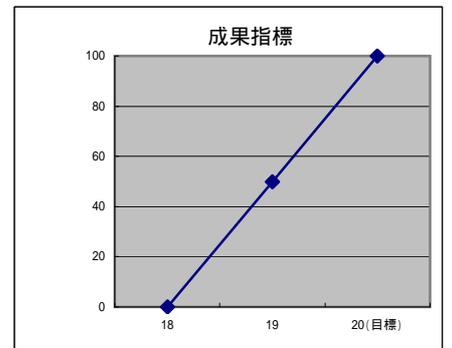


事務事業名		向野第1保育園増改築事業		予算科目	会計	1	一般会計
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	3	次代を担う子どもを育むまち		款	3	民生費
	施策(節)	1	子育て支援		項	2	児童福祉費
	施策の方向	(6)	保育の充実		目	6	保育所費
	関連する計画等	羽曳野市次世代育成支援行動計画			事業	54	向野第1保育園増改築事業
				作成部署	保健福祉部子育て支援課		
				連絡先	072 958 1111 内線 1210		
事業の目的							
対象(誰を・何を)							
向野第1保育園と向野第2保育園							
意図(どういう状態にしたいのか)							
老朽化した施設を整備し、統廃合を実施する事により、安全な保育環境を保つとともに運営の効率化を図る。							
事業の内容							
向野第1保育園の敷地を拡幅して、増築園舎を建設するとともに、既設の鉄筋コンクリート園舎は耐震補強を含む大規模修繕を実施、老朽化した木造園舎は撤去する。また、事業完成後は向野第2保育園を統廃合する。							
根拠法令等							
事業開始時期							
<input type="checkbox"/> 昭和 <input checked="" type="checkbox"/> 平成 18 年 月開始 <input type="checkbox"/> 明確にはわからない 終了年度 平成 20 年度							
事業開始時からの状況変化							
市民や議会の要望							
羽曳野市保育運営懇談会答申(平成16年度)の中で「公立保育園については、統廃合による適正配置を図り、人的、物的資源の再整備を行うこと」と示されている。							
実施手法							
<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他()							
委託先							
<input type="checkbox"/> 外郭団体委託 名称 委託内容							
<input type="checkbox"/> 民間委託							

区分		18年度 (実績)	19年度 (実績)	20年度 (見込み)
事業費【1】	(千円)	12,000	302,810	291,184
人件費【2】	(千円)	12,600	12,600	12,600
職員数	正規職員	1.50 人	1.50 人	1.50 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	超過勤務(参考)	(時間) 0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費(【1】+【2】)【A】	(千円)	24,600	315,410	303,784
財源内訳	国費	(千円)	70,298	102,169
	府費	(千円)		
	市債	(千円)	222,900	134,000
	その他(手数料・使用料等)	(千円)		
	一般財源	(千円)	24,600	22,212
活動指標(事業の活動実績)【B】	単位	18年度	19年度	20年度(目標)
調査・打合せ・協議回数	回	30	120	60
実施設計の委託件数	件	1	4	2
活動単位当たりコスト(【A】/【B】)		820,000 円	2,628,417 円	5,063,067 円
市民1人当たりコスト(【A】/人口)		204 円	2,628 円	2,534 円

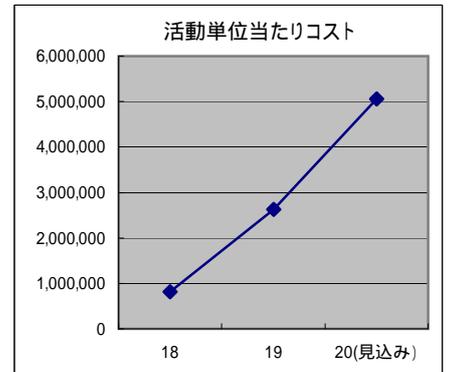

成果指標	指標名	指標設定の考え方	平成18年度		平成19年度		平成20年度	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績
事業進捗率(%)	式) 完了分の事業費 ÷ 全事業費 × 100	事業の完成までを100とし、どの程度事業が進んでいるかをす。	0	0	100	50	100	100
					達成率(%)	50.0%		
	式)							

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性	分析・評価の説明
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある		有

視点	分析のためのチェック点	はい	いいえ	該当なし	分析・評価の説明
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
妥当性	市民ニーズが高い	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設の老朽化及び向野第1保育園と向野第2保育園の統廃合を目的に、事業実施を決定し、設計を行ったものであり、妥当性は高い。
	市民ニーズに比較してサービスの供給過剰となっていない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	社会情勢の変化に対応している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	国・府の事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業を休止、廃止した場合の影響度が大きい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	緊急性が認められる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
効率性	単位コストが適切である(経年、他市比較など)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	実施設計の委託業者は、競争入札により決定されており、効率的である。
	受益者負担の割合は適当である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	簡略化できる方法や手段がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市の他事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	民間活力(民間委託、NPO、ボランティア、PFIなど)の活用について検討の余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
有効性	上位の施策(目的)が明確である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	羽曳野市保育運営懇談会答申に基づいて実施している事業であり、有効である。
	上位の施策(目的)への貢献度が高い事業である	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	成果を向上させる余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市民の視点にたってサービスが提供されている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協働性	事業の企画、立案に市民が参加している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	羽曳野市保育運営懇談会答申に基づいて実施している事業であり、保育園の保護者説明会や地元説明会を開催したり、保育園職員で検討委員会を設置し、幅広く意見を聞きながら実施している。
	事業の実施に向けて、市民と情報の共有が図られている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業の実施について積極的に市民の意見を反映している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業の実施に市民の参加、協力が得られている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
達成度	成果指標の目標値は適正である	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	平成19年度完成の予定だったが建築基準法の改正の遅れにより繰越明許し、同年11月4日に完成
	成果指標の実績値は目標値以上である	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	成果指標は前年度より向上している	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

担当 部局 評価	総合評価	<input type="checkbox"/> 拡大・充実	<input type="checkbox"/> 現状維持	<input checked="" type="checkbox"/> 方法改善	<input type="checkbox"/> 民営化・民間委託	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 廃止・休止	<input type="checkbox"/> 完了	
	評価の理由	計画どおりに事業を進める事が出来ている。							
	今後に向けて(取組方針、具体的な改善改革案など)	今後に向けて(取組方針、具体的な改善改革案など)							
		平成19年度は工事を実施し、完成させる予定であったが。建築基準法の改正が工事進行に大きな影響をもたらした。							
