



事務事業名		史跡峯ヶ塚古墳保存整備事業		予算科目	会計	1	一般会計
					款	10	教育費
					項	5	#N/A
					目	4	文化財保存事業費
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	4	魅力ある地域社会を拓く活力あるまち	事業	60	史跡峯ヶ塚古墳保存整備	
	施策(節)	5	市民文化・芸術	作成部署 教育委員会事務局生涯学習室社会教育課			
	施策の方向	(1)	歴史的資源を活かしたまちづくりの推進	連絡先 072 - 958 - 1111 内線 4481			
関連する計画等							
事業の目的	対象(誰を・何を)						
	峯ヶ塚古墳						
	意図(どういう状態にしたいのか)						
事業の内容	古墳を発掘調査し、市民をはじめ多くの方々に古墳が具体的に体感できると共に、歴史学習の場となるように復元整備する。						
	昭和62年度より継続して実施してきた古墳の確認調査や整備計画案について、一定のまとめと整備・活用の方向性を整理し、大阪府及び文化庁と協議を重ね具体的に復元整備事業を推進する。復元整備に必要な調査を実施した上で、整備検討会での審議、基本設計や実施計画の策定、実施設計の策定を経て、早い時期に峰塚公園と一体となった復元整備を実施する。						
根拠法令等							
事業開始時期		☒ 昭和 ☐ 平成 62 年 月開始 ☐ 明確にはわからない			終了年度	平成 年度	
事業開始時からの状況変化		発掘調査により古墳本来の範囲が広くなり、復元整備及び史跡指定の拡大が必要となる。					
市民や議会の要望		早期の古墳全体の復元整備と、歴史資料館の併設などが望まれている。					
実施手法		☐ 直営 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☒ 補助金・助成金 ☐ その他()					
委託先		☐ 外郭団体委託	名称	委託内容			
		☒ 民間委託					

区 分		18年度	19年度	20年度
		(実績)	(実績)	(見込み)
事業費【1】 (千円)		699		4,327
人件費【2】 (千円)		1,350	840	3,900
職員数	正規職員	0.15 人	0.10 人	0.40 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.05 人	0.00 人	0.30 人
	超過勤務(参考) (時間)	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		2,049	840	8,227
財源内訳	国費 (千円)	349		1,201
	府費 (千円)			
	市債 (千円)			
	その他 (手数料・使用料等) (千円)			
	一般財源 (千円)	1,700	840	7,026
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		18年度	19年度	20年度(目標)
活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】)		円	円	円
市民 1 人当たりコスト (【A】 / 人口)		17 円	7 円	69 円

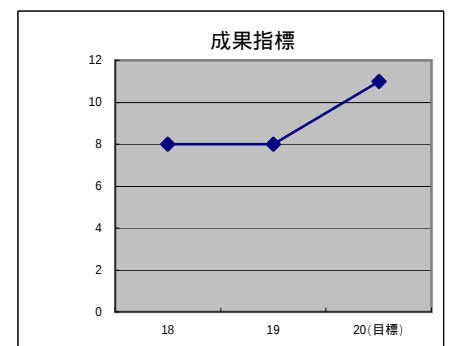

成果指標 (事業目的の達成度を測る指標)	指標名	指標設定の考え方	平成18年度		平成19年度		平成20年度
	(式)	峯ヶ塚古墳調査の達成度を見る	目標	11	11	達成率(%)	11
			実績	8	8	72.7%	9
	(式)	復元整備に係る到達度を見る	目標	100	100	達成率(%)	100
			実績	30	30	30.0%	40

