
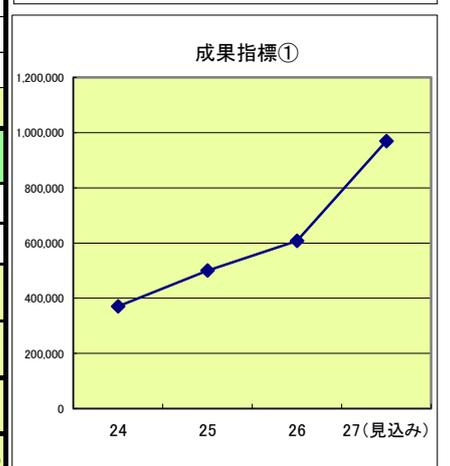


平成 27 年度 事務事業評価シート (平成 26 年度実施事業)

整理番号 土道06

事務事業名			住宅市街地盤整備事業(市道古市153号線)		予 算 科 目	会計	1	一般会計		
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	1	安全・安心、快適で住みやすいまち			款	8	土木費		
	施策(節)	9	道路交通			項	2	道路橋梁費		
	施策の方向	(2)	計画的な道路整備と維持管理の推進			目	2	道路舗装改良事業費		
関連する計画等					事業	67	住宅市街地盤整備事業			
					作成部署	土木部道路公園課				
					(連絡先)	072 - 958 - 1111 内線 2236				
事業の概要(目的・内容)			当該路線は、府営古市住宅建替を促進するため、住宅の建替え整備時に必要な工事車両が通過できる道路の整備を行うとともに、周辺地域の道路ネットワークの拡充を図る。(計画延長 L=580m W=12.0m) 平成21年度 費用対効果分析委託業務、予備設計委託業務 平成22年度 境界確定、道路線形確定、詳細設計委託業務 平成23年度 詳細設計委託業務、用地買収 平成24年度 用地買収 平成25・26年度 道路築造工事 平成28年度～平成30年度 南阪奈道路側道線との交差点整備を図る。							
根拠法令等			道路法							
事業期間			<input type="checkbox"/> 10年以上 <input checked="" type="checkbox"/> 5年以上10年未満 <input type="checkbox"/> 5年未満(平成 年度開始)							
事業開始時からの状況変化										
実施手法			<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> その他( )							
委託先			<input type="checkbox"/> 市外郭団体委託 名称( ) <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託 <input type="checkbox"/> その他			委託内容			測量及び設計業務委託、境界確定業務委託	

区 分		24年度 (実績)	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (見込み)	
事業費【1】	(千円)	224,611	129,845	107,292	5,998	
人件費【2】	(千円)	19,665	15,180	12,171	718	
職員数	正規職員	2.85 人	2.20 人	1.75 人	0.10 人	
	再任用職員	人	人	人	人	
	嘱託職員	人	人	人	人	
	臨時職員・非常勤職員	人	人	人	人	
超過勤務(参考)	(時間)	時間	時間	時間	時間	
総事業費【(1)+(2)】【A】	(千円)	244,276	145,025	119,463	6,716	
財源内訳	国庫支出金	(千円)	64,480	38,000	16,000	0
	府支出金	(千円)				
	市債	(千円)				
	その他(使用料・手数料等)	(千円)				
一般財源【B】	(千円)	179,796	107,025	103,463	6,716	
活動指標【C】	単位	24年度	25年度	26年度	27年度 (見込み)	
① 整備延長	m		388	156		
② 用地買収面積	㎡	3,248			0	
活動単位当たりコスト (【A】÷【C】①)		円 373,776	円 765,790	円	円	
活動単位当たり一般財源額 (【B】÷【C】①)		円 275,838	円 663,226	円	円	
市民1人当たりコスト (【A】÷人口)		円 1,245	円 1,034	円	円	
一般財源【B】の推移(前年度比)			▲ 40.5 %	▲ 3.3 %	▲ 93.5 %	
※前年度比5%以上変動している要因(該当する場合のみ)		<input type="checkbox"/> 1. 制度改正・事業の見直しなど <input type="checkbox"/> 2. 左記1)によらない対象件数などの増減 <input type="checkbox"/> 3. 物価・賃金水準などの変動 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 国庫支出金など特定財源の増減 <input type="checkbox"/> 5. その他( )				
※該当項目すべてに✓						

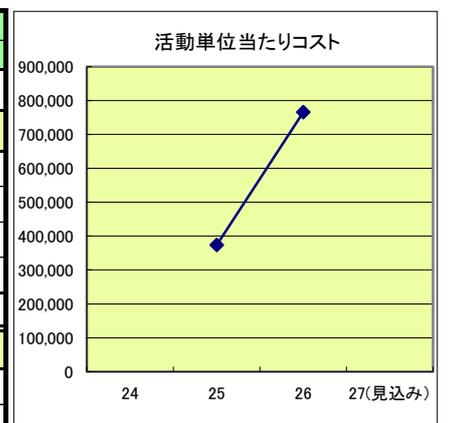

成果指標 (事業の達成度)	指標名	単位	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
①	総事業費に対する整備済事業費		目標	969,000	969,000	969,000	969,000	達成率(%)	62.7%	969,000
			実績	370,683	500,528	607,820				
②			目標					達成率(%)		
			実績							

市の関与の必要性	市の関与が必要な理由									評価
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	必要性
	法令上の義務	受益者が不特定多数	最低限の生活水準を確保	市民の不安を解消	社会的経済的弱者を対象	民間だけでは負担しきれない	民間だけでは供給不足	市の特色等を市内外へ発信	第三者にも受益がある	有
		○	○	○					○	

視点	分析のためのチェック点	はい	いいえ	該当なし	分析・評価の説明
		妥当性	市民ニーズが高い（事業の拡充・継続の要望がある、又、活動指標が増加傾向にあるなど）	<input checked="" type="checkbox"/>	
	市民ニーズと比較してサービスの対象範囲や水準が適切か	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業を縮小、又は廃止・休止した場合の影響度が大きい	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
効率性	活動単位あたりコストが適切である（経年比較など）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	府営住宅から南阪奈道路に接続する道路を整備することにより、居住者の利便性が向上するとともに南古市地域のまちづくりに貢献できる。
	使用料・手数料等の受益者負担の割合は適当である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	人員を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	事業費を削減する余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	国・府の事業や市の他事業と重複していない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	市の他事業との統合や、事業の簡略化の余地がない	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
協働性	民間活力（民間委託、NPO・ボランティアなど）の活用について検討の余地がない（すでに活用しており、拡大の余地はないを含む）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
有効性	事業の企画や実施にあたり、市民の意見を反映しているか、又、参加、協力が得られているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
達成度	成果指標の実績値は目標値以上である	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	平成26年度以降も引き続き道路整備事業が継続するため。
	成果指標は前年度より向上している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	平成25年度よりも道路整備工事は進捗している。

担当部局評価	総合評価			
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 改善	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 廃止・休止
	<small>（概ね現行どおり継続して実施）      （実施方法の改善を検討する）      （事業規模の縮小を検討する）      （廃止・休止を検討する）</small>			
今後に向けて（取組方針・具体的な改善改革案など）				
道路整備を早期に完了させることにより、府営住宅建替事業の推進を図る。				

行革本部評価	総合評価				評価理由・意見
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	<input type="checkbox"/> 改善	<input type="checkbox"/> 縮小	<input type="checkbox"/> 廃止・休止	
