



事務事業名		古市小学校屋内運動場改築事業		予算科目	会計	1	一般会計
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	3	次代を担う子どもを育むまち		款	10	教育費
	施策(節)	2	学校教育		項	2	小学校費
	施策の方向	(2)	教育環境の整備・充実		目	1	学校管理費
	事業	79	古市小学校屋内運動場改築事業		事業	79	古市小学校屋内運動場改築事業
関連する計画等				作成部署	教育委員会事務局学校教育室教育総務課		
				連絡先	072 - 958 - 1111 内線 4131		
事業の目的							
対象(誰を・何を)							
児童・保護者・教職員・地域住民							
意図(どういう状態にしたいのか)							
講堂を屋内運動場に改築し、教育環境の充実と災害時の避難場所としての安全確保を図る。							
事業の内容							
既存の古市小学校の屋内運動場は、地域の防災避難所としての機能はもちろん、教育活動の充実を図る必要性がある。しかしながら、構造上「講堂」のため体育実技にも支障をきたして、老朽化も進んでいるため改築(新築)する。							
概要: (新)屋内運動場(工事期間:平成20年~21年度)RC造2F 延べ床面積930㎡。							
根拠法令等		学校教育法、小学校設置基準、地震防災対策特別措置法、他					
事業開始時期		☐ 昭和 ☒ 平成 18 年 月開始 ☐ 明確にはわからない					
事業開始時からの状況変化		終了年度 平成 21 年度					
市民や議会の要望		講堂を屋内運動場として、建替えるよう要望あり。					
実施手法		☐ 直営 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助金・助成金 ☐ その他()					
委託先		☐ 外郭団体委託 名称 ☐ 委託内容 工事設計・工事監理 ☒ 民間委託					

区 分		18年度	19年度	20年度
		(実績)	(実績)	(見込み)
事業費【1】 (千円)		1,875	15,827	273,016
人件費【2】 (千円)		3,360	6,150	6,114
職員数	正規職員	0.40 人	0.70 人	0.70 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.15 人	0.13 人
	超過勤務(参考) (時間)	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		5,235	21,977	279,130
財源内訳	国費 (千円)			52,164
	府費 (千円)			
	市債 (千円)			156,000
	その他 (手数料・使用料等) (千円)			
	一般財源 (千円)	5,235	21,977	70,966
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		18年度	19年度	20年度(目標)
調査、設計、工事、監理等件数 件		2	1.8	4
活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】)		2,617,500 円	12,209,444 円	69,782,500 円
市民1人当たりコスト (【A】 / 人口)		43 円	183 円	2,328 円

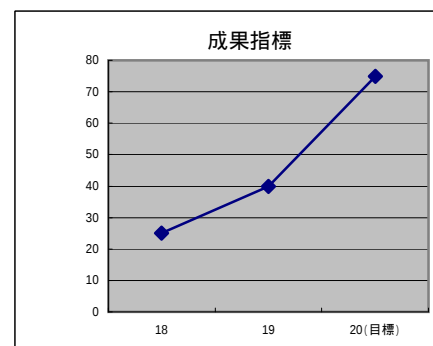

成果指標 (事業目的の達成度を測る指標)	指標名		指標設定の考え方	平成18年度		平成19年度		平成20年度
	事業進捗率 (%) 式 工事出来高 ÷ 工事全体 × 100	改築工事全体を 1 0 0 とした場合の工程の進捗割合	目標	25	50	達成率(%)	75	
			実績	25	40	80.0%		
	式)		目標			達成率(%)		
			実績					

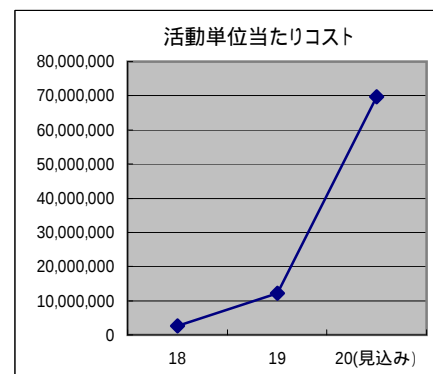
